



**MUNICÍPIO DE CARDOSO**  
**SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

R. DR. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro

Fone (17) 3466-3900 – Ramal 224

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: [secretariaobras@cardoso.sp.gov.br](mailto:secretariaobras@cardoso.sp.gov.br)

Cardoso - Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** PONTE DE CONCRETO ARMADO

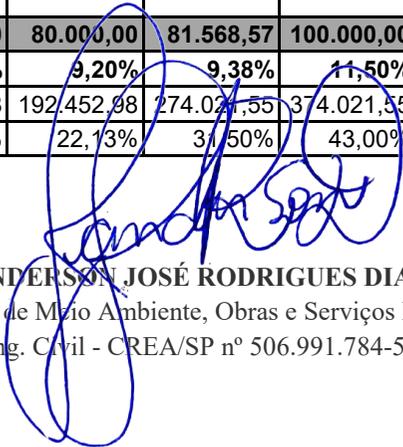
**LOCAL:** CDS 338 - SOBRE O CÓRREGO DO ESPANHOL

**MUNICÍPIO:** CARDOSO/SP

**DATA:** CARDOSO, 10 DE JANEIRO DE 2.024.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	240 DIAS	300 DIAS	360 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.452,98									37.452,98
		4,31%									4,31%
2	INFRAESTRUTURA		75.000,00	80.000,00	71.568,57						226.568,57
			8,62%	9,20%	8,23%						26,05%
3	MESOESTRUTURA				10.000,00	100.000,00	118.408,40				228.408,40
					1,15%	11,50%	13,61%				26,26%
4	SUPER ESTRUTURA						50.000,00	150.000,00	118.095,70		318.095,70
							5,75%	17,25%	13,58%		36,57%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									59.279,06	59.279,06
										6,82%	6,82%
<b>TOTAL NO MÊS R\$</b>		<b>37.452,98</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.568,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>168.408,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.095,70</b>	<b>59.279,06</b>	<b>869.804,69</b>
<b>PORCENTAGEM NO MÊS %</b>		<b>4,31%</b>	<b>8,62%</b>	<b>9,20%</b>	<b>9,38%</b>	<b>11,50%</b>	<b>19,36%</b>	<b>17,25%</b>	<b>13,58%</b>	<b>6,82%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>		37.452,98	112.452,98	192.452,98	274.021,55	374.021,55	542.429,95	692.429,95	810.525,65	869.834,72	
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA %</b>		4,31%	12,93%	22,13%	31,50%	43,00%	62,36%	79,61%	93,18%	100,00%	

Regime de execução: Empreita Global

  
**JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS**  
Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos  
Eng. Civil - CREA/SP nº 506.991.784-5
